



RAPPORT DE VÉRIFICATION

Vérification des installations électriques

(Code du travail : Art R.4226-16)
Rapport de vérification périodique quadriennal

Pièce(s) jointe(s) : Aucune

N° de rapport : 134934646-001-1 - ERT
Date : 29/09/2025



Accréditation n°3-2016
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Lieu d'intervention :
CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL
CTM VILLE DE CHATOU
-
46 AVENUE DU TRAITE DE
ROME 78400 CHATOU
-
HOTEL DE VILLE PLACE DU
GENERAL DE GAULLE
78400 CHATOU

Référence Client : 217750G2

Date(s) d'intervention :
Du 22/09/2025 au 22/09/2025

Intervenant(s) :
NATACHA POQUE LANDON



OBSERVATION(S)

**AGENCE APAVE**

St Quentin en Yvelines
3, rond-point des Saules
78280 GUYANCOURT
Tél. : 0130141430

E-mail : stquentin-yvelines@apave.com

CLIENT

COMMUNE DE CHATOU
HOTEL DE VILLE, PLACE DU GENERAL
DE GAULLE
78400 CHATOU

Ce rapport comporte 49 pages - Version modèle rapport Electricité_ERT_6.22.2

Liste récapitulative des observations

Observations relatives aux installations du domaine Basse Tension

Localisation		Non-conformité - Préconisation (P)
N° Obs	Références réglementaires	
CTM - Ensemble de l'établissement		
➤ Observation(s) local		
1	R. 4215-17 Arrêté du 14/12/2011-4	Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal" pour plusieurs BAES (P) Faire réviser les blocs autonomes ou les remplacer
2	R. 4215-10 NF C15-100 : 514	Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique (P) A remettre à niveau (Les schémas électriques ne sont pas à jour: A mettre à jour / compléter les circuits manquants)
CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des bureaux		
➤ Observation(s) local		
3	R. 4226-07 NF C15-100 : 66	Entrée de câble défectueuse (P) A refaire au niveau de la fiche (1 fiche multiprise dans le grand bureau technique)
CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des circulations		
➤ TGBT		
Pour les mesures Intensités et Tension		
4	R. 4215-03 NF C15-100 : 411	La partie active suivante est sous tension et accessible (P) Isoler les bornes des voltmètres
➤ Sas et local TGBT		
• Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité		
5	R. 4215-17 Arrêté du 14/12/2011-4	Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal" (P) Faire réviser le(s) bloc(s) autonome(s) ou le(s) remplacer
CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des sanitaires		
➤ Coffrets (Schneider)		
• Non identifiée (disjoncteur EATON)		

6

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit
(P) A remettre à niveau

➤ **Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité**

7

R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-4

Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal" (celui de au dessus de la porte côté local électrique)
(P) Faire réviser le(s) bloc(s) autonome(s) ou le(s) remplacer

CTM - Bâtiment Atelier - Magasin

➤ **Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité**

8

R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-4

Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal" (côté porte)
(P) Faire réviser le(s) bloc(s) autonome(s) ou le(s) remplacer
+ (1 BAES sur chemin de câbles)

CTM - Bâtiment Atelier - Magasin - Stockage

➤ **Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité**

9

R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-9

Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal"
(P) Faire réviser le(s) bloc(s) autonome(s) ou le(s) remplacer
(1 BAES , celui au-dessus de la porte)

CTM - Bâtiment Atelier - Serrurerie

➤ **TD02 F1**

• **Prise mono 63A**

10

R. 4215-03
NF C15-100 : 415

Absence de protection complémentaire par dispositif différentiel à haute sensibilité
(P) Installer un dispositif différentiel résiduel de seuil 30mA

Soit In 32A max, soit Canalisation en 10mm²

11

R. 4215-06
NF C15-100 : 433

Réglage/Calibre incorrect de la protection de surcharge du(des) circuit (s)
(P) Les remplacer par des fusibles de protection de calibre adapté à l'intensité admissible

CTM - Bâtiment Atelier - Serrurerie - Bureau

➤ **Convecteur**

12

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Fixation non satisfaisante
(P) A fixer

CTM - Bâtiment Atelier - Menuiserie

➤ Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité

2 Blocs d'ambiance et 1 bloc de sécurité

13

R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-9

Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal"

(P) Faire réviser le(s) bloc(s) autonome(s) ou le(s) remplacer

➤ Prise(s) de courant

14

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse

(P) A refixer durablement

(1 prise de courant au mur côté entrée)

CTM - Bâtiment Atelier - Peinture

➤ Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité

15

R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-9

Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal"

(P) Faire réviser le(s) bloc(s) autonome(s) ou le(s) remplacer

➤ Pompe - SALMSON

16

R. 4215-05
NF C15-100 : 559

Protection de surcharge trop élevée du récepteur

(P) Calibrer/régler les relais thermiques à l'intensité In

CTM - Bâtiment Atelier - Circulation entre atelier

➤ Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité

17

R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-9

Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal"

(P) Faire réviser le(s) bloc(s) autonome(s) ou le(s) remplacer

CTM - Bâtiment Atelier - Plomberie

➤ Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité

18

R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-9

Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal"

(P) Faire réviser le(s) bloc(s) autonome(s) ou le(s) remplacer

CTM - Bâtiment Atelier - Mobilier Urbain

➤ TD02 F3

19

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Fixation non satisfaisante des disjoncteurs Q2 et Q3

(P) A refixer durablement

(sur le rail)

• Q1 Général PC

20

R. 4215-05
NF C15-100 : 559

Matériel utilisé dans des conditions de service non prévues eu égard au risque d'échauffement anormal
(P) Limiter à deux le nombre de conducteurs raccordés en aval des protections.
Alimenter par peigne

CTM - Bâtiment Atelier - Voierie

➤ Coffret Aérotherme (mezzanine)

21

R. 4215-06
NF C15-100 : 526

Serrage mal assuré de(s) la connexion(s)
(P) 0
Cuivre apparent: -> A refaire au niveau des conducteurs sur borniers au 1er plastron

CTM - Bâtiment Mécanique - Atelier bois 2

➤ Appareil(s) d'éclairage masse inac

22

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Verrine (ou vasque) absente
(P) A remettre en place

CTM - Bâtiment Mécanique - Atelier bois 1

➤ Appareil(s) d'éclairage de sécurité

23

R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-9

Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal"
(P) Faire réviser le(s) bloc(s) autonome(s) ou le(s) remplacer

CTM - Bâtiment Mécanique - Hangar

➤ TD03

24

R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-9

Dysfonctionnement du dispositif de mise au repos des blocs autonomes d'éclairage de sécurité
(P) A réviser, réparer ou remplacer

➤ Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité

BAES en hauteur

25

R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-9

Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal"
(P) Remplacer la lampe hors d'usage

CTM - Extérieur - Chaufferie

➤ Armoire chaufferie

6mm²

26

R. 4215-05
NF C15-100 : 559

Protection de surcharge trop élevée de la canalisation (Conducteurs de section 2,5mm² en amont du sectionneur général)
(P) Protéger les canalisations à leurs intensités admissible

➤ Appareil(s) d'éclairage masse inac

27

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Verrine (ou vasque) absente
(P) A remettre en place

x

Numéro d'observation récurrente



Nouvelle observation

(P) : Préconisation

Sommaire

1. Renseignements généraux de l'établissement	9
1.1 Renseignements principaux	9
1.2 Renseignements complémentaires relatifs à la vérification	10
Documents nécessaires à la vérification	10
Limite(s) d'intervention	10
1.3 Changements importants depuis la précédente vérification	10
2. Caractéristiques principales des installations	11
2.1 Structure de l'établissement	11
Nombre de bâtiments / affectation	11
2.2 Structure des installations	11
Désignation des Réseaux	11
Désignation et implantation du ou des Tableaux principaux	11
Caractéristiques des Sources	12
Prises de terre, conducteurs de protection, circuits d'interconnexion	12
2.3 Installations de Sécurité	13
Eclairage de sécurité	13
2.4 Classement des locaux à risques	13
3. Examen des prescriptions applicables	15
NORMES APPLICABLES	15
4. Résultats des mesurages et essais	20
4.1 Appareils de mesurage et d'essais utilisés	20
4.2 Résultats	20
Prises de terre	20
Continuités entre tableaux de la distribution	20
Dispositifs différentiels à courant résiduel	20
Examen des circuits terminaux	25
5. Résultats des autres vérifications	35
Liste des observations des circuits sans différentiel	35
Liste des observations des tableaux	35
6. Annexes	36
Liste des plans et schémas des installations	36
Synoptique de l'installation électrique	36
Tableau ou Armoire - Caractéristiques des appareillages et canalisations	39
Etendue, méthodologie et critères d'appréciation des mesurages	
Rappels sur les vérifications d'installations électriques	48

1. Renseignements généraux de l'établissement

1.1 Renseignements principaux

Etablissement vérifié :	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL CTM VILLE DE CHATOU - 46 AVENUE DU TRAITE DE ROME 78400 CHATOU - HOTEL DE VILLE PLACE DU GENERAL DE GAULLE 78400 CHATOU N° Etab : A4217750G2 N° Mission : C25075010M0001
Installation(s) vérifiée(s) :	Ensemble de l'établissement
Activité principale :	Centre Technique Municipale
Vérification :	
• Nature :	Périodique
• Périodicité réglementaire :	Annuelle
• Dates :	Du 22/09/2025 au 22/09/2025
• Durée (jours) :	16.4
• Date précédente :	07/10/2024
Accompagnement réglementaire :	Aucun
Vérificateur(s) :	Mme NATACHA POQUE LANDON ST QUENTIN EN YVELINES
Surveillance des installations :	M. Philippe AUTRE
Registre de contrôle :	a été présenté et signé
Compte-rendu de fin de visite à :	M. Philippe AUTRE

1.2 Renseignements complémentaires relatifs à la vérification

Documents nécessaires à la vérification

Descriptif Document	Fourni	Incomplet	Non Fourni	Sans Objet
Plan des locaux avec indication des locaux à risques particulier d'influences externes .				✓
Schémas unifilaires des installations électriques		✓		
Rapport de vérification initiale			✓	
Rapports des vérifications périodiques antérieures	✓			
Déclaration CE de conformité et notices des matériels installés dans les emplacements à risque d'explosion				✓
Liste des installations de sécurité et effectif maximal des locaux ou bâtiments	✓			
Eléments de traçabilité des essais réglementaires	✓			

Limite(s) d'intervention

- **Limite(s) d'intervention générale(s)**

Compte-tenu de la configuration des locaux nous n'avons pu effectuer l'ensemble des mesures de continuité des conducteurs de protection entre le TGBT et les différents niveaux de la distribution, nous avons donc effectué un examen visuel conformément à l'annexe I paragraphe 2.2.1 de l'arrêté du 26/12/2011.

- **Limite(s) d'intervention particulière(s)**

Ensemble des installations électriques contrôlées

La continuité à la terre du (des) récepteur(s) noté hauteur inaccessible au paragraphe Examen des circuits terminaux n'a pu être vérifiée.

(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

1.3 Changements importants depuis la précédente vérification

Il nous a été déclaré l'absence de modifications de structure, d'extension d'installation ou d'affectation des locaux.

2. Caractéristiques principales des installations

2.1 Structure de l'établissement

Nombre de bâtiments / affectation

1. L'établissement se compose de 3 bâtiments de type RDC (Un bâtiment Bureaux et deux bâtiments garage/ateliers)

2.2 Structure des installations

Désignation des Réseaux

Désignation	Domaine de tension	Origine	Puissance installée (kVA)	N° Obs
Distribution Force & Eclairage	BT	Public	250	

Information sur le reseau :

- **Localisation :** CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des circulations
 - **Distribution :** Tri + N
 - **Tension :** 230 / 400 V
 - **Schéma Liaison Terre :** TT
 - **Dispositif Coupure :** DDR

Significations des abréviations utilisées

HT : Haute tension	BT : Basse tension	TBT : Très basse tension	Tri + N : Triphasé + Neutre
Dj : Disjoncteur	Fu : Fusibles	DDR : Disjoncteur Différentiel	

Désignation et implantation du ou des Tableaux principaux

Désignation	Localisation
TGBT	CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des circulations

Caractéristiques des Sources

Désignation	Localisation	N° Obs
Distribution Force & Eclairage	CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des circulations	

Information sur la source :

Type : Réseau public
Puissance (kVA) : 250

SLT : TT

Significations des abréviations utilisées			
HT : Haute tension	BT : Basse tension	TBT : Très basse tension	SLT : Schéma de liaison à la terre
Dj : Disjoncteur	Fu : Fusibles	Ucc : Tension de court-circuit	

Prises de terre, conducteurs de protection, circuits d'interconnexion

Désignation	Prise de terre	Constitution	N° Obs
Distribution Force & Eclairage	Masse BT	Inconnue	

Information sur la prise de terre :

- Localisation : CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des circulations
 - Nature : Cuivre
 - Conducteur de protection : Incorporés aux câbles
 - Section (mm²) : 35
 - Interconnexion : Interconnexion des terres

2.3 Installations de Sécurité

Eclairage de sécurité

Eclairage de sécurité installé pour l'ensemble de l'établissement et éventuellement par locaux

Localisation	Effectif	Balisage			Ambiance	
		Imposé	Réalisé	Mise au repos	Imposé	Réalisé
Ensemble de l'établissement	40	Oui	Blocs autonomes	Oui	Non	Sans Objet

2.4 Classement des locaux à risques

Dans le cas d'absence de fourniture d'une liste exhaustive des risques particuliers, le classement éventuel ci-après est proposé par le vérificateur, et sauf avis contraire, considéré comme validé par le chef d'établissement :

Localisation	Zone	Origine classement	Influences externes	Indice mini de Protection
CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des sanitaires		Proposé par le vérificateur	AF1 BE1 AE1 AD2 AG1 IP 21 IK 02	
CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des douches		Proposé par le vérificateur	AF1 BE1 AE1 AD4 AG1 IP 24 IK 02	
CTM - Bâtiment Atelier - Ensemble des locaux		Proposé par le vérificateur	AF1 BE2 AE1 AD2 AG3 IP 21 IK 08	
CTM - Bâtiment Atelier - Magasin - Sanitaires		Proposé par le vérificateur	AF1 BE1 AE1 AD2 AG1 IP 21 IK 02	
CTM - Bâtiment Atelier - Menuiserie		Proposé par le vérificateur	AF1 BE2 AE4a AD2 AG2 IP 51 IK 07	
CTM - Bâtiment Atelier - Stockage essence		Proposé par le vérificateur	AF2 BE2 AE2 AD2 AG3 IP 31 IK 08	
CTM - Bâtiment Mécanique - Ensemble des locaux		Proposé par le vérificateur	AF1 BE2 AE1 AD2 AG3 IP 21 IK 08	
CTM - Extérieur - Chaufferie		Proposé par le vérificateur	AF1 BE2 AE1 AD2 AG2 IP 21 IK 07	

CODIFICATION DES INFLUENCES EXTERNES - INDICES ET DEGRES DE PROTECTION

PENETRATION DE CORPS SOLIDES		SUBSTANCES CORROSIVES OU POLLUANTES		MATIERES TRAITEES OU ENTREPOSEES	
AE1 : Négligeable	IP 2X	AF1 : Négligeable		BE1 : Risques négligeables	
AE2 : Petits objets (2,5 mm)	IP 3X	AF2 : Agents d'origine atmosphérique		BE2 : Risques d'incendie	
AE3 : Très petits objets	IP 4X	AF3 : Intermittente ou accidentelle		BE3 : Risques d'explosion	
AE4a : Poussières	IP 5X (Protégé)	AF4 : Permanente			
AE4b : Poussières	IP 6X (Etanche)				
ACCES AUX PARTIES DANGEREUSES		PENETRATION DE LIQUIDES		RISQUES DE CHOCS MECANIQUES	
Non protégé	IP 0X	AD1 : Négligeable	IP X0	AG1 : Faibles (0,225 J)	IK 02
A : Avec le dos de la main	IP 1X ou IP XXA	AD2a : Chutes de gouttes d'eau	IP X1	AG2 : Moyens (2 J)	IK 07
B : Avec un doigt	IP 2X ou IP XXB	AD2b : Chutes de gouttes d'eau	IP X2	AG3 : Importants (6 J)	IK 08
C : Avec un outil	IP 3X ou IP XXC	AD3 : Aspersions d'eau	IP X3	AG4 : Très importants (20 J)	IK 10
D : Avec un fil	IP 4X ou IP XXD	AD4 : Projections d'eau	IP X4		
		AD5 : Jets d'eau	IP X5		
		AD6 : Paquets d'eau	IP X6		
		AD7 : Immersion	IP X7		
		AD8 : Submersion	IP X8		

IP : Indice de protection contre la pénétration de corps solides ou l'accès aux parties dangereuses

CODIFICATION DES INFLUENCES EXTERNES - INDICES ET DEGRES DE PROTECTION

IK : *Degré de protection contre les risques de chocs mécaniques*

3. Examen des prescriptions applicables

NORMES APPLICABLES

NF C15-100

Arrêtés :

14/12/2011

Article Code du Travail	Libellé item	Norme	Arrêté
R. 4215-01	Obligations générales du Maître d'Ouvrage		
	<i>Règles générales de conception et réalisation</i>	NF C15-100-131	C
R. 4215-02	Dossier technique		
	<i>Mise à disposition des différents éléments</i>	NF C15-100	C
R. 4215-03	Inaccessibilité des parties actives et absence de tension dangereuse en cas de défaut d'isolement		
	<i>Protection contre les contacts directs - règles</i>	NF C15-100-411	NC
	<i>Règles particulières aux différents modes de pose</i>	NF C15-100-529	C
	<i>Protection contre les contacts directs dans un local de service électrique</i>	NF C15-100-729	C
	<i>Protection contre les contacts indirects - règles</i>	NF C15-100-411	C
	<i>Prise de courant (Obturbateurs sur socle de prise de courant ≤ 32A)</i>	NF C15-100-555	C
	<i>Ensemble d'appareillages (armoire) - Mise en œuvre</i>	NF C15-100-558	C
	<i>Protection contre les contacts indirects - essai ou mesurage</i>	NF C15-100-643	C
	<i>Isolement des circuits - essai ou mesurage</i>	NF C15-100-643	C
	<i>Protection par double isolation ou isolation renforcée</i>	NF C15-100-412	C
	<i>Mesure de protection par séparation électrique</i>	NF C15-100-413	SO
	<i>Mesure de protection par TBT (TBTS / TBTP)</i>	NF C15-100-414	SO
	<i>Dispositions complémentaires (LES + DDR)</i>	NF C15-100-415	NC
	<i>Dispositifs de protection contre les chocs électriques - mise en œuvre</i>	NF C15-100-531	C
	<i>Conducteurs de protection - mise en œuvre</i>	NF C15-100-543	C
	<i>Conducteurs d'équipotentialité - mise en œuvre</i>	NF C15-100-544	C
	<i>Installation de mise à la terre - mise en œuvre</i>	NF C15-100-542	C
	<i>Salles d'eau</i>	NF C15-100-701	C
	<i>Piscines, Bassins</i>	NF C15-100-702	SO
	<i>Protection contre les contacts indirects - Générateur d'énergie</i>	NF C15-100-551	C
	<i>Protection contre les contacts indirects - ASI - STS- Démarreur variateur</i>	NF C15-100-553	C
R. 4215-04	Absence de tension dangereuse du fait du voisinage avec une installation de domaine de tension supérieur ou du fait d'un défaut d'isolement		
	<i>Mise en œuvre des conducteurs</i>	NF C15-100-524	C
	<i>Voisinage avec d'autres canalisations électriques</i>	NF C15-100-528	C
	<i>Limiteur de surtension</i>	NF C15-100-534	SO
	<i>Autotransformateur en schéma IT</i>	NF C15-100-552	C
R. 4215-05	Risques liés à l'élévation normale de température des matériels		
	<i>Echauffements dans un local à risque d'incendie</i>	NF C15-100-422	C
	<i>Règles générales de protection contre l'incendie</i>	NF C15-100-421	C

Article Code du Travail	Libellé item	Norme	Arrêté
	<i>Protection contre le risque de brulure sur l'appareillage</i>	NF C15-100-423	C
	<i>Conditions de fonctionnement -Appareillage inadapté avec risque d'échauffement</i>	NF C15-100-512	C
	<i>Echauffements de l'appareillage lumineux</i>	NF C15-100-559	NC
R. 4215-06	Caractéristiques du matériel vis à vis des surintensités / Prévention du risque incendie		
	<i>Diélectrique inflammable</i>	NF C15-100-421	SO
	<i>Protection contre les arcs électriques</i>	NF C15-100-421	C
	<i>Protection des canalisations contre les surintensités - règles</i>	NF C15-100-430	C
	<i>Protections surintensités - disposition suivant la nature des circuits</i>	NF C15-100-431	C
	<i>Protections surintensités - nature des dispositifs de protection</i>	NF C15-100-432	C
	<i>Protection des canalisations contre les surcharges</i>	NF C15-100-433	NC
	<i>Protection des canalisations contre les court circuits</i>	NF C15-100-434	C
	<i>Coordination entre les différents dispositifs de protection</i>	NF C15-100-435	C
	<i>Protection des canalisations - courants admissibles</i>	NF C15-100-523	C
	<i>Sections minimale des conducteurs actifs</i>	NF C15-100-524	C
	<i>Choix et mise en œuvre des connexions</i>	NF C15-100-526	NC
	<i>Choix et mise en œuvre des dispositifs de connexion des installations d'éclairage</i>	NF C15-100-559	C
	<i>Caractéristiques des matériels vis à vis des influences externes</i>	NF C15-100-512	C
	<i>Caractéristiques des matériels vis à vis des effets mécaniques et thermiques produit par les surintensités</i>	NF C15-100-533	C
	<i>Coordination entre les différents dispositifs de protection</i>	NF C15-100-536	C
	<i>Non manœuvre en charge des sectionneurs</i>	NF C15-100-537	C
	<i>Matériels d'installation et d'utilisation, Prise de courant BT > 32A</i>	NF C15-100-555	C
R. 4215-07	Sectionnement des installations		
	<i>Dispositif de sectionnement</i>	NF C15-100-462	C
	<i>Dispositif de sectionnement / coupure</i>	NF C15-100-537	C
	<i>Sectionnement générateurs d'énergie électrique</i>	NF C15-100-551	SO
	<i>Ensemble d'appareillage (armoire) - sectionnement et coupure en charge</i>	NF C15-100-558	C
R. 4215-08	Coupure d'urgence des circuits		
	<i>Coupure d'urgence</i>	NF C15-100-465	C
	<i>Coupure d'urgence</i>	NF C15-100-537	C
R. 4215-09	Mise en œuvre des canalisations		
	<i>Mode de pose des canalisations</i>	NF C15-100-521	C
	<i>Choix en mise en œuvre pour limiter la propagation du feu</i>	NF C15-100-527	C
	<i>Voisinage avec d'autres canalisations</i>	NF C15-100-528	C
	<i>Règles particulières aux différents modes de pose des canalisations</i>	NF C15-100-529	C
	<i>Rayon de courbure des conducteurs et conduits</i>	NF C15-100-522	C
R. 4215-10	Identification des circuits et appareillages		
	<i>Identification et repérage des installations BT</i>	NF C15-100-514	NC
R. 4215-11	Choix du matériel en fonction de la tension et conditions d'environnement		
	<i>Adaptation des matériels à la tension</i>	NF C15-100-512	C
	<i>Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes</i>	NF C15-100-522	C

Article Code du Travail	Libellé item	Norme	Arrêté
	<i>Adaptation du matériel aux influences externes</i>	NF C15-100-522	C
	<i>Appareillage généralité</i>	NF C15-100-530	NC
	<i>Installation du matériel</i>	NF C15-100-555	C
	<i>Ensembles d'appareillage ; règles générales</i>	NF C15-100-558	C
R. 4215-11	Emplacements à risques particuliers d'influences externes		
	<i>Règles particulières pour les salles d'eau</i>	NF C15-100-701	C
	<i>Règles particulières pour les piscines, bassins</i>	NF C15-100-702	SO
	<i>Règles particulières pour les locaux contenant des radiateurs pour saunas</i>	NF C15-100-703	SO
	<i>Règles particulières pour les installations de chantier</i>	NF C15-100-704	SO
	<i>Règles particulières pour les établissements agricoles</i>	NF C15-100-705	SO
	<i>Règles particulières pour les enceintes conductrices exigües</i>	NF C15-100-706	SO
	<i>Règles particulières pour les parcs de caravanes</i>	NF C15-100-708	SO
	<i>Règles particulières pour les ports, ports de plaisance et emplacements analogues Marinas</i>	NF C15-100-709	SO
	<i>Règles particulières pour les installations temporaires</i>	NF C15-100-711	SO
	<i>Règles particulières pour les installations éclairage à très basse tension</i>	NF C15-100-715	SO
	<i>Règles particulières pour les unités mobiles ou transportables</i>	NF C15-100-717	SO
	<i>Règles particulières pour les aires de distribution carburant liquide</i>	NF C15-100-752	SO
	<i>Règles particulières pour les câbles chauffants et systèmes de chauffage Equipements de chauffage électrique pour planchers rayonnants ou installés en plafond ;</i>	NF C15-100-753	SO
	<i>Règles particulières pour les parc de stationnement</i>	NF C15-100-756	SO
	<i>Règles particulières pour les installations non surveillées</i>	NF C15-100-773	SO
R. 4215-12	Mise en œuvre des installations vis à vis du risque d'incendie et/ou explosion		
	<i>Emplacements à risques d'incendie</i>	NF C15-100-422	C
	<i>Emplacements à risque d'explosion</i>	NF C15-100-424	SO
R. 4215-13	Locaux ou emplacements de service électrique		
	<i>Protection contre les contacts directs dans un local de service électrique</i>	NF C15-100-729	SO
	<i>Dispositions constructives / Ventilation dans un local de service électrique</i>	NF C15-100-729	SO
	<i>Dispositions constructives / Ouverture des portes dans un local de service électrique</i>	NF C15-100-729	SO
	<i>Eclairage de sécurité dans un local de service électrique</i>	NF C15-100-729	SO
	<i>Matériel d'exploitation et de sécurité dans un local de service électrique</i>	NF C15-100-729	SO
	<i>Moyens d'extinction dans un local de service électrique</i>	NF C15-100-729	SO
	<i>Batteries d'accumulateurs</i>	NF C15-100-570	SO
R. 4215-15	Conformité des installations aux articles R4215-3 à R4215-13 si respect des normes applicables		
	<i>- aux installations BT intérieures</i>	NF C15-100-1	C
R. 4215-16	Conformité des matériels électriques aux normes NF ou CE		
	<i>Conformité aux normes des matériels BT</i>	NF C15-100-511	C
R. 4215-17	Eclairage de sécurité		
	<i>Application du règlement ERP si plus contraignant</i>		14/12/2011-1 SO

Article Code du Travail	Libellé item	Norme	Arrêté
	<i>Obligation d'une installation fixe (si applicable)</i>		14/12/2011-2 C
	<i>Effectif de l'établissement (mode calcul)</i>		14/12/2011-3 C
	<i>Fonctions de l'éclairage sécurité</i>		14/12/2011-4 NC
	<i>Mise en œuvre de l'éclairage d'évacuation (sauf dérogation)</i>		14/12/2011-5 C
	<i>Mise en œuvre de l'éclairage d'ambiance ou anti-panique</i>		14/12/2011-6 SO
	<i>Type autorisé (source centrale ou bloc autonome)</i>		14/12/2011-7 C
	<i>Eclairage alimenté par source centrale</i>		14/12/2011-8 SO
	<i>Eclairage réalisé par BAES</i>		14/12/2011-9 NC
R. 4226-05	Coupage des installations, dépose des écrans, anciennes prescriptions normatives		
	<i>Coupage de courant et essai autorisés</i>		C
	<i>Dépose des plastrons</i>		C
R. 4226-07	Surveillance et maintenance des installations		
	<i>Etat mécanique apparent des matériels</i>	NF C15-100-512	C
	<i>Fixation des matériels et appareillages</i>	NF C15-100-530	C
	<i>Fixation des luminaires</i>	NF C15-100-559	C
	<i>Maintien en état des installations – fixation des canalisations</i>	NF C15-100-521	C
	<i>Maintien en état des installations – état du matériel</i>	NF C15-100-522	C
	<i>Echauffements</i>	NF C15-100-66	C
	<i>Etat général des installations</i>	NF C15-100-66	NC
R. 4226-09	Locaux réservés à la production, conversion, distribution d'électricité		
	<i>Affichages et inscriptions dans un local de service électrique</i>	NF C15-100-729	SO
	<i>Portes, conditions d'ouverture et fermeture dans un local de service électrique</i>	NF C15-100-729	SO
R. 4226-10	Locaux présentant des risques particuliers de choc électrique		
	<i>Barrière à poissons</i>		17/03/1993-- SO
	<i>Pêche à l'électricité</i>		02/02/1989-- SO
	<i>Galvanoplastie, électrophorèse, électrolyse, fours à arc :</i>		15/12/2011-- SO
	<i>- Tensions limites - Prévention du contact direct</i>		15/12/2011-1 SO
	<i>- Prévention en cas d'inapplicabilité de l'art. 1</i>		15/12/2011-2 SO
	<i>Laboratoires et plates-formes d'essais :</i>		16/12/2011-- SO
	<i>- Délimitation des emplacements et signalisation</i>		16/12/2011-2 SO
	<i>- Repérage des points d'alimentation et signalisation de la présence et de l'absence de tension</i>		16/12/2011-3 SO
	<i>- Prévention des risques de contact direct</i>		16/12/2011-4 SO
	<i>- Protection contre les risques de contact indirect</i>		16/12/2011-5 SO
	<i>- Dispositifs de coupure d'urgence</i>		16/12/2011-6 SO
	<i>- Interdiction de remise sous tension automatique</i>		16/12/2011-7 SO
	<i>- Adaptation des mesures prévues dans l'article 2 pour les essais réalisés hors zones normalement dédiées</i>		16/12/2011-8 SO
R. 4226-11	Installations de soudage électrique :		
	<i>Tension d'alimentation, tension de contact, isolation, conducteur de retour, connecteurs</i>		19/12/2011-2 SO
	<i>Porte-électrodes, torches ou pistolets</i>		19/12/2011-3 SO
	<i>Soudage à l'intérieur d'une enceinte conductrice exiguë</i>		19/12/2011-4 SO
	<i>Soudage sur des chantiers spécialisés de construction</i>		19/12/2011-5 SO
R. 4226-12	Utilisation et raccordement des appareils amovibles		
	<i>Limitation de la tension d'alimentation ou indice de</i>		20/12/2011-2 SO

Article Code du Travail	Libellé item	Norme	Arrêté
	<i>protection adapté</i>		
	<i>Adaptation aux influences externes</i>	20/12/2011-3	SO
	<i>Canalisations souples d'alimentation</i>	20/12/2011-4	SO
	<i>Prises de courant, prolongateurs et connecteurs</i>	20/12/2011-5	SO
	<i>Raccordement hors charge des prises de courant, prolongateurs et connecteurs > 32 ampères</i>	20/12/2011-6	SO
	<i>Utilisation des appareils portatifs à main dans les enceintes conductrices exigües</i>	20/12/2011-7	SO
R. 4226-13	Maintenance de l'éclairage sécurité		
	<i>Dispositif de mise à l'état de repos</i>	14/12/2011-9	C
	<i>Mise à l'état de veille, de repos, d'arrêt</i>	14/12/2011-10	C
	<i>Essais réglementaires de l'employeur</i>	14/12/2011-11	C
	<i>Lampes de rechange</i>	14/12/2011-12	C

Significations des abréviations utilisées

C : Conforme

NC : Non conforme

SO : Sans objet

PM : Pour mémoire

4. Résultats des mesurages et essais

4.1 Appareils de mesure et d'essais utilisés

Continuité/isolément, masses et circuits	Essais des DDR	Tests des CPI	Mesures des prises de terre	Continuité de précision (si requis)
ELECTRO-P JP WHEEL-E	MEGGER MFT 1835		MEGGER MFT 1835	

4.2 Résultats

Prises de terre

Localisation	Désignation	Conditions de mesure / Barrette	Valeur (Ω)
CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des circulations	Masse BT	Ensemble interconnecté	0.5

Continuités entre tableaux de la distribution

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur ($m\Omega$)
CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des circulations	TGBT	Masse BT	inférieur à 2000
CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des sanitaires	TD01	TGBT	<2000
CTM - Bâtiment Atelier - Magasin - Stockage	TD02	TGBT	<2000
CTM - Bâtiment Atelier - Menuiserie	TD02 F2	TD03	<2000
CTM - Bâtiment Atelier - Mobilier Urbain	TD02 F3	TD0	<2000
CTM - Bâtiment Mécanique - Hangar	TD03	TGBT	<2000

Dispositifs différentiels à courant résiduel

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolément (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des circulations							
➤ TGBT							
1	Général	DDR	3000	150 ms	B		
1	A.U.	DDR	300		B		
1	Voltmètre	DDR	300	Inst	B		
1	Télécommande extérieur	DDR	300	Inst	B		
1	Télécommande BAES	DDR	30	Inst	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Sèche-mains 1	DDR	30	Inst	B		
1	Sèche-mains	DDR	30	Inst	B		
1	Prise Salage	DDR	30	Inst	B		
1	Général Pc Cuisine	DDR	30	Inst	B		
1	Horloge	DDR	30	Inst	B		
1	Chauffage foyer	DDR	30	Inst	B		
1	Ventilo foyer	DDR	30	Inst	B		
CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des sanitaires							
➤ TD01							
1	DTU (Chaufferie)	DDR	300	Inst	B		
1	Force motrice BEC	DDR	300	Inst	B		
1	Force motrice Aéro	DDR	300	Inst	B		
1	Infirmierie	DDR	30	Inst	B		
1	Général éclairage	DDR	300	Inst	B		
1	Eclairage Douches	DDR	30	Inst	B		
1	Général Pc	DDR	30	Inst	B		
1	Prise machines à café	DDR	30	Inst	B		
1	BECS	DDR	300	Inst	B		
1	Alarme Technique	DDR	300	Inst	B		
1	Départ Anti-intrusion	DDR	300	Inst	B		
1	Autocom	DDR	30	Inst	B		
1	Force extraction 1	DDR	300	Inst	B		
1	Force extraction 2	DDR	300	Inst	B		
1	Prise machines à boissons	DDR	30		B		
1	Général ondulées	DDR	30	Inst	B		
1	Prise Informatique	DDR	30	Inst	B		
1	Lumière couloir	DDR	300	Inst	B		
2	Départ Divers	DDR	30	Inst	B		
➤ Coffrets (Schneider)							
1	Chauffage bureau	DDR	30		B		
1	Général	DDR	30		B		
1	Roadlocker	DDR	30	Inst	B		
1	Non identifiée (disjoncteur EATON)	DDR	30	Inst	B	NM	6

CTM - Bâtiment Atelier - Magasin - Stockage

➤ **TD02**

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	AU	DDR	300		B		
1	Général éclairage	DDR	300	Inst	B		
1	Alimentation Alarme Locaux	DDR	30	Inst	B		
1	AU	DDR	300	Inst	B		
1	Général Pc	IDR	30	Inst	B		
1	Extracteur	DDR	30	Inst	B		
1	Général prise	DDR	30	Inst	B		
1	Chauffage Bureau	DDR	300	Inst	B		
12	Départs ventilo	DDR	300	Inst	B		
2	Départs Extraction	DDR	300	Inst	B		
1	Départs Dépoussiéreuse	DDR	300	Inst	B		
3	Alimentation Coffret F1 / F2 / F3	DDR	1000	Inst	B		
1	Général Chauffage	IDR	300	Inst	B		
1	Départs Aérotherme transport	DDR	300	Inst	B		
CTM - Bâtiment Atelier - Serrurerie							
➤ TD02 F1							
1	AU	DDR	300		B		
1	Général Pc	DDR	30	Inst	B		
1	Aspirateur fumée	DDR	30	Inst	B		
1	Perceuse PROMAC	DDR	300	Inst	B		
1	Chauffe eau	DDR	300	Inst	B		
1	Atelier serrurerie	DDR	300	Inst	B		
1	Tronçonneuse	DDR	300	Inst	B		
1	SAFMIG	DDR	30	Inst	B		
1	Prise mono 63A	DDR	300	Inst	B	NM	10 11
CTM - Bâtiment Atelier - Menuiserie							
➤ TD02 F2							
1	AU	DDR	300	Inst	B		
1	Q1 Général PC	DDR	30	Inst	B		
1	Q2 Départ Atelier Menuiserie	DDR	300	Inst	B		
1	Q3 Départ Atelier Menuiserie	DDR	300	Inst	B		
1	Q4 Mortaiseuse	DDR	300	Inst	B		
1	Q5 Dégauchisseuse	DDR	300	Inst	B		
1	Q6 Raboteuse	DDR	300	Inst	B		
1	Filtration	DDR	30	Inst	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
1	Q7 Toupie	DDR	300	Inst	B		
1	Q8 Scie à Ruban	DDR	300	Inst	B		
1	Scie à panneaux	DDR	30	Inst	B		
1	Groupe aspiration Principal	DDR	30	Inst	B		
1	Extraction	DDR	30	Inst	B		
1	Plaqueuse	DDR	30	Inst	B		
1	Tour à bois	DDR	30	Inst	B		
1	Groupe aspiration Télécommande	DDR	300	Inst	B		
CTM - Bâtiment Atelier - Mobilier Urbain							
➤ TD02 F3							
1	AU	DDR	300	Inst	B		
1	Q1 Général PC	DDR	30	Inst	B	NM	20
1	Q2 Départ Atelier Nettoyage	DDR	300	Inst	B		
1	Q3 Départ Atelier Nettoyage	DDR	300	Inst	B		
1	Q4 BEC	DDR	300	Inst	B		
1	Q5 Compresseur	DDR	30	Inst	B		
1	Q6 Radiateur	DDR	30	Inst	B		
CTM - Bâtiment Mécanique - Atelier mécanique							
➤ Armoire Extracteur							
1	Aérotherme	DDR	30	Inst	B		
CTM - Bâtiment Mécanique - Hangar							
➤ TD03							
1	Chauffage bureau	DDR	300	Inst	B		
1	Aérotherme	DDR	300	Inst	B		
1	Général éclairage	DDR	300	Inst	B		
1	Pc Booster	DDR	30	Inst	B		
1	Général Pc	DDR	30	Inst	B		
1	Aérotherme Atelier Station Service	DDR	300	Inst	B		
2	VMC	DDR	300	Inst	B		
1	Général Force motrice	IDR	300	Inst	B		
1	Force motrice Palan	DDR	30	Inst	B		
1	AU	DDR	300	Inst	B		
1	Pont élévateur	DDR	300	Inst	B		
1	Mécanique	DDR	30	Inst	B		
CTM - Extérieur							
➤ Coffret DTU							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I_{\Delta n}$ (mA)	Tempo (s)			
1	Eclairage	DDR	300	Inst	B		
CTM - Extérieur - Chaufferie							
➤ Armoire Chaufferie primaire							
1	Général Q5	DDR	30	Inst	B		

Significations des abréviations utilisées			
DDR : Disjoncteur Différentiel	IDR : Interrupteur Différentiel	RD : Relais différentiel	IΔn : Intensité différentielle
B : Bon fonctionnement du différentiel < = à 1A ou bon fonctionnement mécanique du différentiel > à 1A	M : Fonctionnement incorrect du différentiel < = à 1A ou fonctionnement incorrect mécanique du différentiel > à 1A	NE : Fonctionnement du différentiel < = à 1A ou fonctionnement mécanique du différentiel > à 1A non essayé	Tempo : Temporisation

Examen des circuits terminaux

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolément (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des bureaux										3
4	Appareil(s) d'éclairage	2								
8	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
9	Appareil(s) d'éclairage MIPI									
2	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
46	Prise(s) de courant (2025)								B	
10	Ensemble Bureautique								B	
1	Imprimante (sur PC)								B	
CTM - Bâtiment Bureaux - Salle de réunion										
4	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
8	Prise(s) de courant (2025)								B	
2	Prise(s) de courant (non mesurées, en hauteur) (2025)								B	
CTM - Bâtiment Bureaux - Cuisine										
2	Appareil(s) d'éclairage MIPI									
4	Prise(s) de courant								B	
4	Four à micro-ondes (sur PC)								B	
4	Réfrigérateur (sur PC)								B	
1	Plaque de cuisson (sur PC)								B	
1	Lave-vaisselle								B	
CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des circulations										
➤ Sas et local TGBT										

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolément (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
1	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
1	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
2	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2							NM	5
34	Appareil(s) d'éclairage	2								
5	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
6	Prise(s) de courant								B	
3	Prise de courant (en hauteur)								B	
2	Distributeurs de boissons								B	
1	Fontaine réfrigérante (sur PC)								B	

CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des sanitaires

➤ **Local Armoire**

1	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
4	Prise(s) de courant								B	
1	Baie informatique								B	
1	Chargeur								B	
8	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2							NM	7

CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des vestiaires

6	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
2	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								

CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des douches

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolément (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
5	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
7	Appareil(s) d'éclairage	2								
3	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
CTM - Bâtiment Atelier - Magasin										
17	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
3	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2							NM	8
4	Prise(s) de courant								B	
3	Aérotherme (en hauteur)								B	
CTM - Bâtiment Atelier - Magasin - Bureau										
4	Appareil(s) d'éclairage	2								
17	Prise(s) de courant (2025)								B	
2	Ensemble Bureautique								B	
CTM - Bâtiment Atelier - Magasin - Reserve										
1	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
4	Prise(s) de courant								B	
CTM - Bâtiment Atelier - Magasin - Sanitaires										
2	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
CTM - Bâtiment Atelier - Magasin - Stockage										
4	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolément (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
3	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2							NM	9
2	Prise(s) de courant								B	
2	Aérotherme (en hauteur) MIPI				0.3	RT	0.4	0.3		

CTM - Bâtiment Atelier - Serrurerie

8	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
10	Prise(s) de courant								B	
2	Aérotherme (en hauteur)								B	
1	Perceuse à colonne								B	
1	Scie à ruban								B	
1	Touret								B	

CTM - Bâtiment Atelier - Serrurerie - Bureau

1	Appareil(s) d'éclairage MIPI									
4	Prise(s) de courant								B	
1	Convecteur	2							NM	12

CTM - Bâtiment Atelier - Menuiserie

12	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
3	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2							NM	13
12	Prise(s) de courant								B	
1	Prise(s) de courant								B NM	14
3	Aérotherme (en hauteur)								B	
2	Machines CASADEI								B	
1	Machines COPEAU								B	

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolément (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
1	Machines F.2056 B								B	
2	Machines SICM CHANBON								B	
1	Machines STRIEBIG								B	
1	Perceuse à colonne								B	
1	Scie à ruban								B	
1	Extracteur								B	

CTM - Bâtiment Atelier - Peinture

5	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
2	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2							NM	15
5	Prise(s) de courant								B	
1	Pompe		SALMSON						B NM	16
1	Réfrigérateur (sur PC)								B	
1	Four à micro-ondes (sur PC)								B	
2	Aérotherme (en hauteur)								B	

CTM - Bâtiment Atelier - Stockage polyvalence

2	Appareil(s) d'éclairage MIPI									
4	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
6	Prise(s) de courant								B	
1	Ensemble Bureautique								B	
1	Aérotherme (en hauteur)								B	

CTM - Bâtiment Atelier - Circulation entre atelier

➤ **Reserve**

1	Appareil(s) d'éclairage masse inac									
---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolément (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
	MIPI									
3	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
2	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2							NM	17
2	Prise(s) de courant								B	
1	Aérotherme (masses inaccessibles)								B	
CTM - Bâtiment Atelier - Plomberie										
3	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2							NM	18
4	Prise(s) de courant								B	
1	Aérotherme (en hauteur)								B	
CTM - Bâtiment Atelier - Signalisation										
4	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
6	Prise(s) de courant								B	
1	Aérotherme (en hauteur)								B	
1	Touret								B	
1	Perceuse à colonne								B	
CTM - Bâtiment Atelier - Mobilier Urbain										
4	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
2	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
3	Prise(s) de courant								B	

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolément (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
1	Aérotherme (en hauteur)								B	
CTM - Bâtiment Atelier - Voierie										
2	Appareil(s) d'éclairage inac h > 4 m MIPI									
9	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
4	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
6	Prise(s) de courant								B	
3	Aérotherme								B	
CTM - Bâtiment Atelier - Electricité										
4	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
2	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
10	Prise(s) de courant								B	
1	Aérotherme (en hauteur)								B	
CTM - Bâtiment Atelier - Stockage essence										
1	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
3	Prise(s) de courant								B	
CTM - Bâtiment Atelier - Transport										
15	Appareil éclairage MIPI									
2	Appareil éclairage de sécurité	2								
6	Prise de courant								B	
2	Aérotherme								B	
CTM - Bâtiment Mécanique - Atelier bois 2										
15	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolément (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
1	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI								NM	22
2	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
5	Prise(s) de courant								B	
CTM - Bâtiment Mécanique - Atelier bois 1										
12	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
1	Appareil(s) d'éclairage de sécurité	2							NM	23
2	Prise(s) de courant								B	
CTM - Bâtiment Mécanique - Atelier mécanique										
➤ Bureau										
2	Appareil(s) d'éclairage MIPI	2								
6	Prise(s) de courant								B	
1	Ensemble Bureau								B	
➤ Reserve produit										
2	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
1	Prise(s) de courant								B	
➤ Reserve lavabo										
1	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
6	Prise(s) de courant								B	
1	Chauffe eau								B	
10	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
2	Appareil éclairage de sécurité	2								
28	Prise(s) de courant								B	
1	Aérotherme				13	PI			B	

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolément (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
1	Pont élévateur								B	
4	Machines								B	
1	Démonteur de pneus								B	
CTM - Bâtiment Mécanique - Hangar										
12	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
4	Appareil(s) d'éclairage inac h > 4 m MIPI									
2	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2							NM	25
1	Appareil(s) d'éclairage de sécurité	2								
4	Prise(s) de courant								B	
CTM - Extérieur										
10	Appareil(s) d'éclairage inac h > 4 m MIPI									
16	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
CTM - Extérieur - Chaufferie										
2	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
1	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI								NM	27
2	Prise(s) de courant								B	
1	Pompe primaire 1				3.39	RE	4	3.6	B	
1	Pompe primaire 2				3.39	RE	4	3.6	B	
1	Pompe aérotherme 1				2.05	RT	4	2.5	B	
1	Pompe Radiateur 1				1.15	RT	1.6	1.1	B	
1	Pompe Radiateur 2				0.75	RT	1.6	1.1	B	
1	Pompe Cuisine 1				3	RT	4	4	B	
1	Pompe Cuisine 2				3	RT	4	4	B	

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolément (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
1	Chaudière (Caractéristiques inaccessibles)								B	

* En absence de renseignement classe 1

Significations des abréviations utilisées			
Cl : Classe	In : Intensité nominale	B : Continuité satisfaisante	M : Continuité non satisfaisante
Dj : Disjoncteur	DDR : Disjoncteur Différentiel	IDR : Interrupteur Différentiel	I : Interrupteur
Fu : Fusibles	RE : Relais Electronique	PI : Protection Intégrée	PSNE : Protection Surcharge non exigée
RT : Relais Thermique	RM : Relais Magnétique	RMT : Relais Magnétothermique	ND : Non déterminé
MIPI : Masse Inaccessible Protection Intrinsèque – sans objet	NM : Non mesuré		

5. Résultats des autres vérifications

Liste des observations des circuits sans différentiel

Aucune non-conformité n'a été constatée

Liste des observations des tableaux


Localisation - Désignation	N° Obs
CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des circulations	
➤ TGBT	4
CTM - Bâtiment Atelier - Mobilier Urbain	
➤ TD02 F3	19
CTM - Bâtiment Atelier - Voierie	
➤ Coffret Aérotherme (mezzanine)	21
CTM - Bâtiment Mécanique - Hangar	
➤ TD03	24
CTM - Extérieur - Chaufferie	
➤ Armoire chaufferie	26

6. Annexes

Liste des plans et schémas des installations

Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
	Schémas consultables sur place	Entreprise	

Synoptique de l'installation électrique

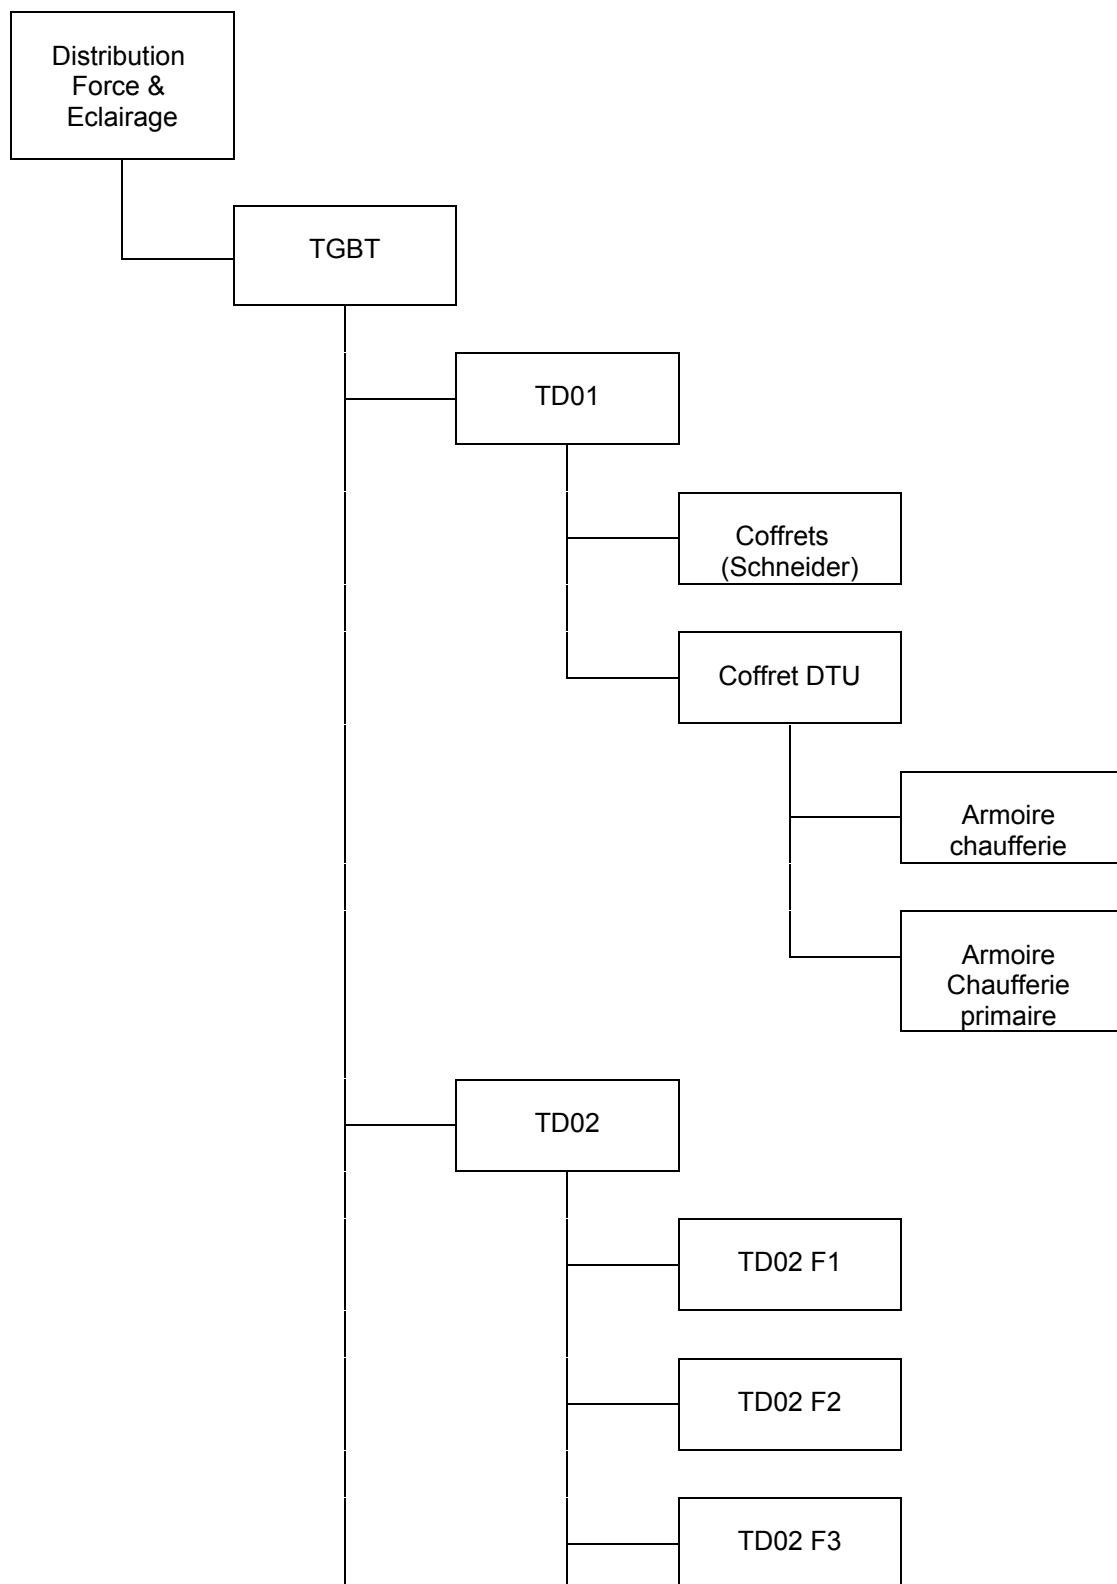

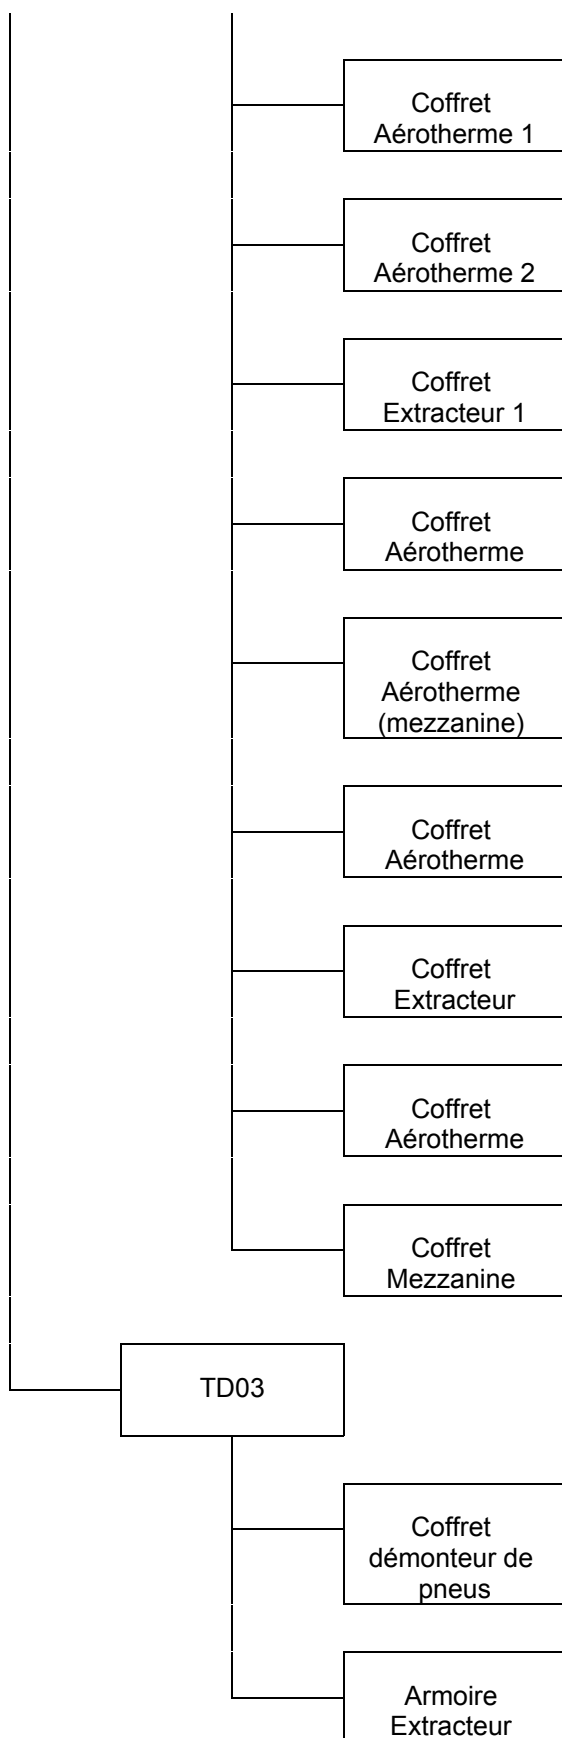


Tableau ou Armoire - Caractéristiques des appareillages et canalisations

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection						Canalisations					
		Type	Nbre Pôles	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg ⁽¹⁾	IΔn (mA) ⁽²⁾	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE

CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des circulations

➤ TGBT

Ik3 max : 6 kA **Ik1 max :** 4 kA **Id :** **F :** 0,8

Référence client : **Armoire amont :** Distribution Force & Eclairage

. 1	Général	DDR	4/4	240	240	480	3000	36					
. 1	A.U.	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
.. 1	Voltmètre	DDR	4/4	10	10	C	300	10					
.. 1	Télécommande extérieur	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
.. 1	Télécommande BAES	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
.. 1	Départ Alimentation TD01	Dj	4/4	63	63	C		10	U1000R 2V		3x16	1x16	1x16
.. 1	Départ Alimentation TD02	Dj	4/4	80	80	C		10	U1000R 2V		3x25	1x25	1x25
.. 1	Départ Alimentation TD03	Dj	4/4	80	80	C		10	U1000R 2V		3x25	1x25	1x25
.. 1	Sèche-mains 1	DDR	2/1	16	16	C	30	6			3x25	1x25	1x25
.. 1	Sèche-mains	DDR	2/1	16	16	C	30	6			3x25	1x25	1x25
.. 1	Prise Salage	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
.. 1	Général Pc Cuisine	DDR	4/4	40	40	C	30	15					
... 2	PC Cuisine	Dj	2/1	16	16	C		6					
... 1	PC Cuisine	Dj	2/1	32	32	C		6	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
.. 1	Horloge	DDR	2/1	10	10	C	30	6					
.. 1	Chauffage foyer	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
.. 1	Ventilo foyer	DDR	2/1	10	10	C	30	6					

CTM - Bâtiment Bureaux - Ensemble des sanitaires

➤ TD01

Ik3 max : 4 kA **Ik1 max :** 2 kA **Id :** **F :** 0,8

Référence client : **Armoire amont :** TGBT

. 1	Général Armoire	Dj	4/4	63	63	C		10					
.. 1	DTU (Chaufferie)	DDR	4/4	32	32	C	300	10	U1000R 2V		1x6	0x6	
.. 1	Force motrice BEC	DDR	2/1	16	16	C	300	6	U1000R 2V		1x2,5	1x2,5	
.. 1	Force motrice Aéro	DDR	2/1	16	16	C	300	6	U1000R 2V		1x2,5	1x2,5	1x2,5
.. 1	Infirmierie	DDR	2/1	15	15	U	30	4.5					
.. 1	Général éclairage	DDR	4/4	40	40	C	300	10					
... 1	Eclairage Douches	DDR	2/1	15	15	U	30	4.5					
... 7	Divers Éclairages	Dj	2/1	10	10	C		6					
.. 1	Général Pc	DDR	4/4	40	40	C	30	10					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôles	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg ⁽¹⁾	IΔn (mA) ⁽²⁾	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
... 7	Drivers PC	Dj	2/1	16	16	C		6					
... 1	PC Circulation	Dj	2/1	20	20	C		6					
... 1	PC Cuisine	Dj	2/1	32	32	C		6					
... 1	PC Local Repli	Dj	2/1	10	10	C		6					
.. 1	Prise machines à café	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
.. 1	BECS	DDR	2/1	16	16	C	300	6					
.. 1	Alarme Technique	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
.. 1	Départ Anti-intrusion	DDR	2/1	16	16	C	300	6					
.. 1	Autocom	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
.. 1	Force extraction 1	DDR	4/4	16	16	C	300	10					
.. 1	Force extraction 2	DDR	4/4	16	16	C	300	10					
.. 1	Prise machines à boissons	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 1	Général ondulées	DDR	2/2	40	40	C	30	10					
.. 2	Divers PC	Dj	2/1	16	16	C		6					
.. 1	Prise Informatique	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
.. 1	Lumière couloir	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
.. 2	Départ Divers	DDR	2/1	10	10	C	30	6					
.. 2	Départ Divers	Dj	2/1	10	10	C		6					

➤ **Coffrets (Schneider)**

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** **F : 0,8**

Référence client : **Armoire amont : TD01**

. 1	Chauffage bureau	DDR	2/1	16	16	C	30	6
. 1	Général	DDR	4/3	40	40	C	30	10
.. 1	Roadlocker	DDR	4/3	16	16	C	30	6
.. 1	Non identifiée (disjoncteur EATON)	DDR	2/1	16	16	C	30	10

CTM - Bâtiment Atelier - Magasin - Stockage

➤ **TD02**

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** **F : 0,8**

Référence client : **Armoire amont : TGBT**

. 1	AU	DDR	2/1	10			300	
. 1	Général Armoire	I	4/0	100				
.. 1	Général éclairage	DDR	4/4	40	40	C	300	10
... 1	Éclairage bureau Magasin	Dj	2/1	16	16	C		6
... 1	Éclairage Atelier	Dj	2/1	10	10	C		6
... 1	Éclairage Atelier Menuiserie	Dj	2/1	10	10	C		6
... 1	Éclairage Atelier Peinture	Dj	2/1	10	10	C		6
... 1	Éclairage Sanitaire et Circulation	Dj	2/1	10	10	C		6
... 5	Divers Éclairage	Dj	2/1	10	10	C		6
.. 1	Alimentation Alarme Locaux	DDR	2/1	10	10	C	30	6
.. 1	AU	DDR	2/1	10	10	C	300	6

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôles	Calibre In (A)	Surcharge lth (A)	Mg ⁽¹⁾	IΔn (mA) ⁽²⁾	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
.. 1	Général Pc	IDR	4/0	63	63		30						
... 4	Divers PC	Dj	2/1	16	16	C		6					
.. 1	Extracteur	DDR	2/1	10	10	C	30	6					
.. 1	Général prise	DDR	4/4	40	40	C	30	10					
... 9	Divers PC	Dj	2/1	16	16	C		6					
... 1	PC 32 Bureau	Dj	2/1	32	32	C		6	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
.. 1	Chauffage Bureau	DDR	2/1	16	16	C	300	6					
.. 12	Départs ventilo	DDR	2/1	16	16	C	300	6					
.. 2	Départs Extraction	DDR	4/4	16	16	C	300	10					
.. 1	Départs Dépoussiéreuse	DDR	3/3	16	16	C	300	10					
.. 3	Alimentation Coffret F1 / F2 / F3	DDR	4/4	63	63	C	1000	10					
.. 1	Général Chauffage	IDR	2/0	25	25		300						
.. 1	Départs Aérotherme transport	DDR	4/4	63	63	C	300	10					

➤ **Coffret Aérotherme 1**

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** **F : 0.8**

Référence client : **Armoire amont : TD02**

.. 1	Général	IS	2/0	32	32								
.. 2	Ventilo 1 & 2	RT	3/3	0.4	0.3								

➤ **Coffret Extracteur 1**

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** **F : 0.8**

Référence client : **Armoire amont : TD02**

.. 1	Général	IS	2/0	32	32								
.. 1	Extracteur	RT	3/3	2.5	2								

➤ **Coffret Aérotherme 2**

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** **F : 0.8**

Référence client : **Armoire amont : TD02**

.. 1	Général	IS	2/0	32	32								
.. 3	Ventilo 1/2/3	RT	3/3	0.4	0.3								

CTM - Bâtiment Atelier - Serrurerie

➤ **TD02 F1**

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** **F : 0,8**

Référence client : **Armoire amont : TD02**

.. 1	AU	DDR	2/1	10			300						
.. 1	Général Armoire	I	4/0	63									
.. 1	Général Pc	DDR	2/1	40	40	C	30	6					
.. 1	Aspirateur fumée	DDR	3/3	16	16	C	30	5					
.. 1	Perceuse PROMAC	DDR	3/3	16	16	C	300	10					
.. 1	Chauffe eau	DDR	2/1	16	16	C	300	6					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôles	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
.. 1	Atelier serrurerie	DDR	3/3	16	16	C	300	10					
.. 1	Tronçonneuse	DDR	3/3	16	16	C	300	10					
.. 1	SAFMIG	DDR	3/3	16	16	C	30	10					
.. 1	Prise mono 63A	DDR	2/2	50	50	D	300	10					

➤ Coffret Aérotherme

Ik3 max : Ik1 max : Id : F : 0.8

Référence client : Armoire amont : TD02

.. 1	Général	IS	2/0	32	32								
.. 2	Ventilo 1 & 2	RT	3/3	0.4	0.3								

CTM - Bâtiment Atelier - Menuiserie

➤ TD02 F2

Ik3 max : Ik1 max : Id : F : 0,8

Référence client : Armoire amont : TD02

.. 1	AU	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
.. 1	Général Armoire	I	4/0	63	63								
.. 1	Q1 Général PC	DDR	4/4	40	40	C	30	10					
... 3	Divers PC	Dj	2/1	16	16	C		6					
.. 1	Q2 Départ Atelier Menuiserie	DDR	3/3	16	16	C	300	6					
.. 1	Q3 Départ Atelier Menuiserie	DDR	2/1	16	16	C	300	6					
.. 1	Q4 Mortaiseuse	DDR	3/3	16	16	C	300	10					
.. 1	Q5 Dégauchisseuse	DDR	3/3	16	16	C	300	10					
.. 1	Q6 Raboteuse	DDR	3/3	16	16	C	300	10					
.. 1	Filtration	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
.. 1	Q7 Toupie	DDR	3/3	16	16	C	300	10					
.. 1	Q8 Scie à Ruban	DDR	3/3	16	16	C	300	10					
.. 1	Scie à panneaux	DDR	4/4	16	16	C	30	10					
.. 1	Groupe aspiration Principal	DDR	4/3	40	40	D	30	10					
.. 1	Extraction	DDR	4/4	16	16	C	30	10					
.. 1	Plaqueuse	DDR	4/4	16	16	C	30	5					
.. 1	Tour à bois	DDR	3/3	16	16	C	30	5					
.. 1	Groupe aspiration Télécommande	DDR	2/1	10	10	C	300	6					

CTM - Bâtiment Atelier - Mobilier Urbain

➤ TD02 F3

Ik3 max : Ik1 max : Id : F : 0,8

Référence client : Armoire amont : TD02

.. 1	AU	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
.. 1	Général Armoire	I	4/0	63	63								
.. 1	Q1 Général PC	DDR	2/1	40	40	C	30	6					
... 1	Divers PC	Dj	2/1	16	16	C		6					
.. 1	Q2 Départ Atelier Nettoyage	DDR	2/1	16	16	C	300	6					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge lth (A)	Mg ⁽¹⁾	IΔn (mA) ⁽²⁾	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
.. 1	Q3 Départ Atelier Nettoyage	DDR	2/1	16	16	C	300	6					
.. 1	Q4 BEC	DDR	3/3	16	16	C	300	10					
.. 1	Q5 Compresseur	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
.. 1	Q6 Radiateur	DDR	2/1	10	10	C	30	6					

➤ Coffret Aérotherme

Ik3 max : Ik1 max : Id : F : 0.8

Référence client : Armoire amont : TD02

. 1	Général	IS	2/0	32	32
.. 1	Ventilo 1	RT	3/3	0.4	0.3

➤ Coffret Extracteur

Ik3 max : Ik1 max : Id : F : 0.8

Référence client : Armoire amont : TD02

. 1	Général	IS	2/0	32	32
.. 1	Extracteur	RT	3/3	2.5	2

CTM - Bâtiment Atelier - Electricité

➤ Coffret Aérotherme

Ik3 max : Ik1 max : Id : F : 0.8

Référence client : Armoire amont : TD02

. 1	Général	IS	2/0	32	32
.. 1	Ventilo 1	RT	3/3	0.4	0.3

CTM - Bâtiment Atelier - Transport

➤ Coffret Mezzanine

Ik3 max : Ik1 max : Id : F : 0.8

Référence client : Armoire amont : TD02

. 1	Général	IS	4/0	63	63								
.. 1	Entrée	Dj	2/1	20	20	C	6	U1000R 2V		1x2,5	1x2,5	1x2,5	
.. 1	NI	Dj	2/1	16	16	C	6	U1000R 2V		1x2,5	1x2,5	1x2,5	
.. 1	NI	Dj	2/1	16	16	C	6	U1000R 2V		1x2,5	1x2,5	1x2,5	
.. 1	Aérotherme Calicots	Dj	2/1	10	10	C	6	U1000R 2V		1x1,5	1x1,5	1x1,5	
.. 1	Télécommande	Dj	2/1	10	10	C	6	U1000R 2V		1x1,5	1x1,5	1x1,5	

CTM - Bâtiment Mécanique - Atelier mécanique

➤ Coffret démonteur de pneus

Ik3 max : Ik1 max : Id : F : 0.8

Référence client : Armoire amont : TD03

. 1	Général	I	4/0	32	32
-----	---------	---	-----	----	----

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôles	Calibre In (A)	Surcharge lth (A)	Mg ⁽¹⁾	IΔn (mA) ⁽²⁾	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
.. 1	Protection Démonte Pneus	Dj	4/3	10	10	C		6					
.. 1	Protection Équilibrée	Dj	2/1	10	10	C		6					
.. 1	Éclairage	Dj	2/1	10	10	C		6					

➤ Armoire Extracteur

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** **F : 0.8**

Référence client : **Armoire amont : TD03**

.. 1	Général force	IS	4/0	63	63								
.. 1	Aérotherme	DDR	4/3	20	20	C	30	6					
.. 1	Extracteur Gaz	RT	3/3	2.5	2.1								
.. 1	Extracteur	RT	3/3	4	2.5								

CTM - Bâtiment Mécanique - Hangar

➤ TD03

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** **F : 0,8**

Référence client : **Armoire amont : TGBT**

.. 1	Général Armoire	Dj	4/4	63	63	B		10	U1000R 2V	1x25	1x25	1x25
.. 1	Chauffage bureau	DDR	2/1	16	16	C	300	6	U1000R 2V	1x2,5	1x2,5	1x2,5
.. 1	Aérotherme	DDR	4/4	40	40	C	300	10	U1000R 2V	1x6	1x6	1x6
.. 1	Signalisation	Dj	2/1	10	10	C		6	U1000R 2V	1x1,5	1,5	1,5
.. 1	Général éclairage	DDR	4/4	32	32	C	300	10	U1000R 2V	1x6	1x6	1x6
... 1	Divers Éclairage	Dj	2/1	10	10	C		6	U1000R 2V	1x1,5	1,5	1,5
... 2	Éclairage Atelier Mécanique	Dj	2/1	10	10	C		6	U1000R 2V	1x1,5	1,5	1,5
.. 1	Pc Booster	DDR	2/1	20	20	C	30	6	U1000R 2V	1x2,5	1x2,5	1x2,5
.. 1	Général Pc	DDR	4/4	40	40	C	30	10	U1000R 2V	1x6	1x6	1x6
... 6	Divers PC	Dj	2/1	16	16	C		6	U1000R 2V	1x2,5	2,5	2,5
... 1	Alarme	Dj	2/1	10	10	C		6	U1000R 2V	1x1,5	1,5	1,5
.. 1	Aérotherme Atelier Station Service	DDR	4/4	32	32	C	300	10	U1000R 2V	1x6	1x6	1x6
.. 2	VMC	DDR	4/4	16	16	C	300	10	U1000R 2V	1x2,5	1x2,5	1x2,5
.. 1	BEC	Dj	2/1	10	10	C		6	U1000R 2V	1x1,5	1,5	1,5
.. 1	Général Force motrice	IDR	4/0	63	63		300		U1000R 2V	1x25	1x25	1x25
... 1	Force Motrice Porte Atelier	Dj	4/4	16	16	C		10	U1000R 2V	1x2,5	2,5	2,5
... 1	Force motrice Palan	DDR	4/4	16	16	C	30	5	U1000R 2V	1x2,5	1x2,5	1x2,5

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôles	Calibre In (A)	Surcharge lth (A)	Mg ⁽¹⁾	IΔn (mA) ⁽²⁾	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
.. 1	AU	DDR	2/1	10	10	C	300	6	U1000R 2V		1x1,5	1x1,5	1x1,5
... 1	Force Motrice Porte Garage	Dj	4/4	16	16	C		10	U1000R 2V		1x2,5	2,5	2,5
... 1	Général Équilibreuses	Dj	2/1	16	16	C		10	U1000R 2V		1x2,5	2,5	2,5
... 1	Départ Coffret Démonte Pneus	Dj	4/4	20	20	C		10	U1000R 2V		1x2,5	2,5	2,5
... 1	Compresseurs	Dj	3/3	16	16	D		6	U1000R 2V		1x2,5	2,5	2,5
.... 1	Compresseurs	I	4/0	40	40				U1000R 2V		1x6	6	6
... 1	Pont élévateur	DDR	4/3	16	16	C	300	6	U1000R 2V		1x2,5	1x2,5	1x2,5
... 1	Mécanique	DDR	2/1	10	10	C	30	6	U1000R 2V		1x1,5	1x1,5	1x1,5
... 1	Porte Garage	Dj	4/4	10	10	C		10	U1000R 2V		1x1,5	1,5	1,5

CTM - Extérieur

➤ **Coffret DTU**
Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** **F : 0.8**
Référence client : **Armoire amont : TD01**

. 1	Général force	Dj	4/4	32	32	C		10
. 1	Eclairage	DDR	2/1	16	16	C	300	6

CTM - Extérieur - Chaufferie

➤ **Armoire chaufferie**
Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** **F : 0,8**
Référence client : **Armoire amont : Coffret DTU**

. 1	Général Armoire	IS	4/0	32				
-----	-----------------	----	-----	----	--	--	--	--

➤ **Armoire Chaufferie primaire**
Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** **F : 0,8**
Référence client : **Armoire amont : Coffret DTU**

. 1	Général Armoire	IS	4/0	32				
.. 1	Général Q5	DDR	2/1	16	16	C	30	6
... 1	Q4 Alim SOFREL	Dj	2/1	6	6	C		6
... 1	Q3 Compteur Énergie	Dj	2/1	2	2	C		6
... 1	Q2 Prim TR V2V	Dj	2/1	2	2	C		6
.... 1	Q1 Secondaire TR V2V	Dj	2/1	6	6	C		6

⁽¹⁾Mg: magnétique ⁽²⁾IΔn: sensibilité différentielle mA

Significations des abréviations utilisées

In : Intensité nominale	Ik : Intensité de court-circuit	Iz : Intensité admissible	lth : Réglage du dispositif de protection
Id : Intensité de défaut phase/terre	PdC : Pouvoir de coupure	F : Facteur de correction	Nbre pôle : Nombre de pôle coupé/protégé
Ph/N : Phase / Neutre	Ph/N : Phase / Neutre	PE : Conducteur de protection	PSNE : Protection Surcharge non exigée
PI : Protection Intégrée	IS : Interrupteur sectionneur	IF : Interrupteur fusible	ISF : Interrupteur sectionneur fusible

Significations des abréviations utilisées

S : Sectionneur	SF : Sectionneur fusible	Fu : Fusibles	IDR : Interrupteur Différentiel
INV : Inverseur	Dj : Disjoncteur	DDR : Disjoncteur Différentiel	DDA : Dispositif de Déconnexion Auto
RT : Relais Thermique	RE : Relais Electronique	RM : Relais Magnétique	RMT : Relais Magnétothermique
C : Contacteur	DC : Discontacteur	RD : Relais différentiel	Xa/b : a pôles coupés, b pôles protégés
Mg : magnétique	IΔn : sensibilité différentielle mA	FL : Filiation	

Etendue, méthodologie et critères d'appréciation des mesurages

Préambule

Les mesures / essais à effectuer sont définis selon le type de vérification (Initiale, à la demande de l'Inspection du Travail, Périodique, Temporaire), lorsque possible en fonction des conditions rencontrées sur le site et de la mise à disposition des installations.
Les méthodologies de mesurage utilisées et les valeurs limites sont celles décrites dans les normes d'installation rendues applicables par l'arrêté du 19/04/2012 (notamment série NF C15-100, NF C 15-150-1, NF EN 50107-1, NF C 15-211, NF C13-100, NF C13-200, NF C17-200).

Résistance des Prises de terre

- **Etendue** : La mesure de la résistance de la prise de terre est effectuée pour tous les types de vérification.
- **Méthodologie** :
Ces mesures sont effectuées soit par la méthode des 2 terres auxiliaires, soit par la méthode de boucle, soit toute autre méthode appropriée.
Dans tous les cas la mesure est effectuée barrette fermée, ainsi que barrette ouverte si nécessaire et si possible.
- **Valeurs limites**

Type de réseau	Valeur Id (A) HT	Valeur maximum prise de terre				Masses BT TT (Ohm)
		TNR – ITR (Ohm)	TTS (Ohm)			
			U _{tp} = 2 kV	U _{tp} = 4 kV	U _{tp} = 10 kV	
Aéro-souterrain	40	26	30	30	30	50 / I Delta n
	150	6	10	24	30	
	300	3	5	12	30	
Souterrain	1000	1	1	3	10	

Pour la NF C 13 200, en règle générale, une valeur de prise de terre inférieure ou égale à 1 ohm est présumée satisfaisante à cette exigence.

U_{tp} : tension de tenue des masses du poste - Id : courant de défaut à la terre du réseau HT de distribution publique

Continuité des conducteurs de protection

- **Etendue** : Les mesures de continuité sont effectuées :
 - Quelque soit le type de vérification, comme suit :
 - Liaisons entre chaque niveau de la distribution et le niveau suivant (remplacé par un examen visuel en cas d'impossibilité).
 - Tous les matériels fixes et amovibles de classe I, y compris prolongateurs et accessoires présentés.
 - Lors de chaque vérification initiale et sur demande de l'Inspection du Travail, de la totalité des appareils d'éclairage et prises de courant accessibles.
 - Lors de chaque vérification périodique, de la moitié des prises de courant accessibles dans les locaux de bureaux (ou locaux ayant des influences externes assimilées), la totalité dans les autres locaux, et du tiers des appareils d'éclairage fixes accessibles depuis le sol.
- **Méthodologie** : La vérification est effectuée à l'aide d'un milliohmètre, d'un ohmmètre ou visuellement.
- **Valeurs limites**
 - **En basse tension** :
La valeur de la continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de distribution doit être systématiquement indiquée lors des vérifications initiales.
Les valeurs de continuité des conducteurs de protection aboutissant aux différents matériels doivent être comparées à celles préconisées dans le paragraphe D.6.2 ou D.6.3 du guide UTE C 15-105; toutefois, lors des vérifications initiales ou sur demande de l'inspection du travail réalisées en schéma TN ou IT, en l'absence de notes de calculs justificatives dans le dossier technique, les valeurs sont à comparer à celles du tableau DC du paragraphe D.6.1 du guide UTE C 15-105.
 - **En haute tension** :
En cas de doute, ou lorsque l'examen visuel n'est pas réalisable, une mesure de continuité doit être effectuée; entre deux points simultanément accessibles.
La résistance mesurée doit être au plus égale à 200 mΩ.
- **Unité des valeurs** : milli-ohm ou ohm.
- **Sur les prises de courant sans millésime est réalisée tous les ans.**
- **Sur les appareils d'éclairage ou prises de courant avec millésime est réalisée à la date du millésime.**

Isolement des Circuits et Matériels BT

- **Etendue** : Quelque soit le type de vérification, les mesures d'isolement sont effectuées sur tous les appareils portatifs à main et mobiles présentés, les matériels fixes et semi-fixes dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse, ainsi que les circuits pour lesquels le fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel est défectueux ou absent, à l'exception des matériels alimentés en TBTS ou TBTP, de classe II.
- **Méthodologie** : La mesure d'isolement est effectuée entre conducteur actif et masse (ou terre) à l'aide d'un ohmmètre approprié suivant le domaine de tension.
- **Valeurs limites** : 0,5 Mégohm pour U > 500V (NF C15-100 ou NF C17-200), pour les câbles chauffants noyés dans les parois, 0,25 Mégohm pour U ≤ 230V, 0,40 Mégohm pour U > 230V.
- **Unité des valeurs** : Mégohm

Essai du (des) Contrôleur(s) Permanent d'isolement (CPI)

- **Etendue** : L'essai du CPI (sauf si présence d'un défaut) est effectué quel que soit le type de vérification pour les installations à neutre isolé ou impédant à l'exclusion des réseaux HT.
- **Méthodologie** : Essai avec une résistance calibrée, complété par la vérification de l'efficacité de la signalisation et de son report.
- **Valeurs limites** : Cohérence de l'indication du CPI avec la valeur de la résistance calibrée; bon fonctionnement de la signalisation et de son report
- **Unité des valeurs** : kOhm

Essais des Dispositifs Différentiels Résiduels (DDR)

- **Etendue** : L'essai des DDR est effectué sur tous les appareils installés quel que soit le type de vérification à l'exclusion des réseaux HT et les DDR > à 1A. Cet essai est réalisé si l'établissement l'autorise et le rend possible.
- **Méthodologie** : L'essai des DDR est réalisé par création d'un défaut réel sur l'installation ou d'un défaut amont-aval (méthode 1 ou 2 de l'annexe 6B du titre 6 de la NFC15-100-1).
- **Valeurs limites** : Essais satisfaisants si la valeur de déclenchement est comprise entre la valeur assignée (I delta n) et la moitié de la valeur assignée (I Delta n/2).
- **Unité des valeurs** : mA
- Pour les DDR > à 1A seul un test de fonctionnement mécanique par le bouton test est réalisé.

Rappels sur les vérifications d'installations électriques en application des articles R. 4226-14, R. 4226-16, R. 4226-21 et R. 4722-26 du code du travail

1. OBJECTIF

Les vérifications en application des articles ci-dessus ont pour but de rechercher les points où les installations électriques s'écartent des dispositions fixées par :

- les articles R. 4215-3 à 17 et R. 4226-5 à 13 Code du Travail,
- le décret mines et carrières décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité,
- les arrêtés pris pour leurs applications et des normes concernées (dans la limite des prescriptions visant la sécurité des personnes vis-à-vis des risques électriques).

Elles sont conduites selon la méthodologie définie par l'arrêté du 26/12/2011.

Les vérifications initiales (R. 4226-14) ou suite à modification de structure visent à donner un avis sur la conformité de la conception / réalisation des installations électriques neuves ou modifiées, alors que les vérifications périodiques (R. 4226-16) visent à s'assurer du maintien en état de conformité des installations existantes et non modifiées (cf §6).

La vérification sur demande de l'Inspection du Travail (R. 4722-26) est identique à l'initiale, mais porte sur une installation existante.

Les vérifications d'installations temporaires (R. 4226-21) sont effectuées à la demande du Chef d'établissement (dénommé « Employeur » dans le Code du travail) et ne sont pas incluses dans aucun des types de vérifications précisées ci-dessus sauf en VDT (R4722-26).

Ces différents types de vérifications concernent la protection des personnes au travail vis-à-vis des risques d'électrisation et de brûlures dues aux installations électriques, à l'exclusion de tout autre objectif, par exemple :

- sûreté de fonctionnement et sélectivité des installations électriques,
- protection contre la foudre, etc,
- voire des objectifs visés par d'autres réglementations :
 - protection du public contre les risques d'incendie et de panique
 - protection des biens et de l'environnement
 - conformité des produits, etc.

L'attention est également attirée sur le fait que certaines installations ou équipements peuvent être assujettis à d'autres textes et doivent faire l'objet de vérifications spécifiques; il en est ainsi, par exemple :

- des équipements de travail (protection vis à vis des risques mécaniques),
- des appareils de levage, de manutention ou de transport par câbles,
- des installations émettrices de rayonnements (protection vis-à-vis des risques dus aux rayonnements ionisants et non ionisants),
- des installations de protection ou de détection des risques d'incendie et d'explosion (protection vis à vis de la protection des biens et du public),
- des installations d'alarme, de transmission de données, de comptage,
- des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

2. ETENDUE ET LIMITES

Conformément à l'arrêté du 26/12/2011 fixant l'objet et l'étendue des vérifications, celles-ci portent sur la matérialité physique des installations électriques, c'est-à-dire l'ensemble des matériels électriques présentés lors de la vérification et mis en œuvre dans l'établissement, tels que matériels de production, transformation, transport, distribution, ou utilisation.

Le respect de la normalisation des matériels, notamment lorsqu'il est concrétisé par un marquage officiel, leurs apporte une présomption de conformité. En conséquence, les examens sont limités à leurs adaptations aux conditions d'usage et à leurs états apparents.

La vérification d'un équipement de travail porte sur les points suivants :

- adaptation de l'équipement de travail aux caractéristiques de l'installation fixe d'alimentation, en ce qui concerne le schéma des mises à la terre et le courant de court-circuit présumé au point d'installation,
- adaptation des différentes enveloppes et des câbles aux conditions d'influences externes,
- protection contre les contacts directs,
- protection contre les contacts indirects en cas de défaut d'isolement sur les masses accessibles,
- protection contre les surintensités de la canalisation fixe alimentant la machine.

La vérification ne concerne pas la protection contre les surintensités des circuits internes ni la protection des moteurs contre les échauffements anormaux des équipements de travail soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché.

Par ailleurs, les installations électriques étant examinées en tenant compte des contraintes d'exploitation et de sécurité propres à chaque établissement, la vérification peut être limitée dans certains cas à leurs seuls états apparents.

De plus, Apave ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir signalé les défauts sur des appareils non présentés, parties d'installations inaccessibles, renseignements erronés, etc.

Sont exclus du champ de la vérification :

- les dispositions administratives, organisationnelles et sécuritaires relatives à l'information et à la formation du personnel chargé de l'exploitation courante, des travaux ou interventions,
- les dispositions administratives relatives aux documents à tenir à la disposition des autorités publiques,
- l'examen des matériels électriques en présentation ou en démonstration et destinés à la vente,
- les matériels en stock, en réserve, signalés comme n'étant plus mis en œuvre.

3. ORGANISATION DE LA VERIFICATION

Afin d'assurer l'ensemble des investigations imposées par l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit organiser la vérification avec l'intervenant Apave dès le début de visite, en particulier :

- signaler les parties d'installations nouvelles ou ayant fait l'objet de modifications de structure, pour lesquelles une vérification initiale a été faite (cf. §6),
- donner les moyens d'accès aux locaux et équipements (ouverture d'armoires électriques, appareils en hauteur, etc.),
- ainsi qu'une autorisation d'accès aux locaux de service électrique (cf NF C18 510 art 11.4.2),
- faire assurer les mises hors tension des installations permettant les mesurages et essais, puis les remises sous tension,
- fournir les pièces du dossier technique des installations électriques définies par l'arrêté du 20/04/2012, en particulier :
 - les notes de calculs justifiant du dimensionnement et de la protection,
 - les schémas complets et à jour,
 - les rapports de vérification initiale, suite à modification de structure, périodique annuel et quadriennal précédents,
 - le plan de classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes, notamment à risque d'incendie et d'explosion, à défaut le

classement de l'intervenant Apave ne constitue qu'une proposition, à valider par le Chef d'établissement.

Indication, le cas échéant par famille de locaux, des conditions d'influences externes et des degrés minimaux de protection des matériels.

Les emplacements à risques d'explosion et leur classification en zones figurent dans « le document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE) » établi et mis à jour par le chef d'établissement, il n'est pas du ressort du vérificateur de proposer un tel classement.

Si nécessaire, une limite d'intervention est portée dans le rapport à ce sujet indiquant que le DRPCE n'a pas été réalisé ou fourni par le chef d'établissement et qu'une analyse permettant sa rédaction doit être menée.

- Pour les zones avec atmosphères explosives (ATEX) :
 - le document relatif à la prévention contre les explosions (DRPCE), prévu aux articles R.4227-50 et 52 du code du travail,
 - le rapport de sécurité des installations électriques, en application de l'arrêté du 8/07/2003.
- Note DGT mars 2024 :
 - Dépose et repose des plastrons des armoires basse tension :
La dépose et repose des plastrons est à réaliser par une personne habilitée de l'établissement ou missionnée pour le faire par le client. Si ce n'est pas réalisé, l'intervenant APAVE procède à la dépose et repose des plastrons sauf refus du client. Cette intervention pourra faire l'objet d'une facturation complémentaire. En cas de refus ou de risque pour l'intervenant APAVE, cela fera l'objet d'une observation et l'acte technique ne sera pas réalisé.
 - Essais des dispositifs différentiels :
L'essai des dispositifs différentiels est à réaliser pendant la vérification réglementaire. Si ces essais ne sont pas autorisés, Apave propose une coupure décalée. En cas de refus, l'absence d'essais fera l'objet d'une observation dans le rapport et un plan de coupure sera à réaliser par le client pour les prochaines vérifications.
 - Essais des dispositifs de coupure d'urgence des armoires de distribution basse tension :
L'essai des systèmes télécommandés des coupures d'urgence des armoires de distribution basse tension est à réaliser pendant la vérification réglementaire. Si ces essais ne sont pas autorisés, Apave propose une coupure décalée. En cas de refus, l'absence d'essais fera l'objet d'une observation dans le rapport et un plan de coupure sera à réaliser par le client pour les prochaines vérifications.
 - Coupure décalées :
En cas de coupure décalée ce rapport fera l'objet d'un rapport en complète et remplace.

4. CONDUITE DE LA VERIFICATION

Lorsque l'insuffisance de la mise à disposition des moyens ci-dessus ne permet pas d'exécuter complètement la vérification, mention en est faite dans le rapport Apave.

Il appartient alors au Chef d'Etablissement de prendre à sa charge dans les plus brefs délais l'organisation des compléments.

A défaut, la vérification pourrait être considérée comme une vérification non réglementaire.

Concernant la continuité à la terre des appareils d'éclairage qui n'aurait pu être mesurée lors des vérifications, l'attention du chef d'établissement doit être attirée sur le fait qu'en cas d'intervention ultérieure sur ces appareils d'éclairage ou dans leur voisinage, il devra préalablement procéder ou faire procéder à cette vérification (Arr. du 26/12/2011-Annexe II, Art 1).

5. RAPPORTS

Les rapports établis conséquemment aux différents types de vérifications répondent aux prescriptions définies par l'arrêté du 26/12/2011.

Ainsi, le rapport périodique annuel est limité aux informations à caractères administratifs ainsi qu'aux seules non-conformités constatées, alors que le rapport périodique quadriennal contient toutes les informations imposées.

Les observations sont référencées aux articles du Code du travail, et le cas échéant à l'arrêté d'application concerné et/ou la norme d'installation définie par l'arrêté du 19/04/2012, dans sa dernière version.

Lorsque la version de la norme applicable à l'installation est antérieure à cette dernière version, les opérations qui permettent de lever les observations sont à réaliser dans le cadre de cette norme antérieure sauf si l'ampleur des travaux les soumet à une visite initiale électrique qui sera réalisée en référence à la dernière version de la norme concernée.

Le rapport réglementaire de vérification des installations électriques est destiné à l'employeur, lorsque le contractant (Facility Manager par exemple), n'est pas l'employeur, l'original du livrable doit lui être adressé.

Sauf avis contraire du Chef d'établissement, dûment notifié à l'agence APAVE qui a émis le présent rapport, dans un délai de deux mois maximum à compter de la date d'envoi, le contenu du présent est considéré comme définitivement validé.

6. MODIFICATIONS DE STRUCTURE

Conformément à l'article R. 4226-6 du Code du travail, les modifications de structure⁽¹⁾ doivent donner lieu à une vérification initiale effectuée par un organisme accrédité, lors de leur mise en service.

Ainsi, les parties d'installations rencontrées en vérification périodique qui entrent dans ce cadre, ne font pas l'objet d'une telle vérification 'de conformité', elles sont signalées à l'Etablissement à qui il revient de faire réaliser cette vérification.

⁽¹⁾ Modification de la puissance de court-circuit, du schéma des liaisons à la terre, modification/ajout de circuits de distribution, création/réaménagement d'installations

7. SURVEILLANCE ET MAINTENANCE

La vérification des installations électriques ne constitue qu'un des éléments concourant à la protection des travailleurs contre les dangers des courants électriques ; aussi, et conformément à l'article R. 4226-7 du Code du travail, le chef d'établissement doit mettre en place une organisation de la surveillance des installations électriques chargée de détecter en permanence d'éventuelles déficiences pouvant apparaître entre deux vérifications.

Les déficiences relevées dans le cadre des vérifications et de la surveillance doivent être levées dans les plus brefs délais.

8. INSTALLATIONS TEMPORAIRES

Les installations temporaires établies le cas échéant entre deux vérifications périodiques, doivent faire l'objet d'une vérification spécifique (cf Art. R. 4226-21) dans les conditions définies par les arrêtés des 22/12/2011 et 26/12/2011.

9. INTERVENTIONS D'ENTREPRISES EXTERIEURES

Conformément aux dispositions des articles R.4511-5 à R.4511-8 du Code du travail, des dispositions de sécurité particulières parfaitement définies doivent être prises par les responsables des entreprises concernées pour toute intervention sur ou à proximité des installations électriques.
